



17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN MANUAL DE DOTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN


17.1. Mesa docente

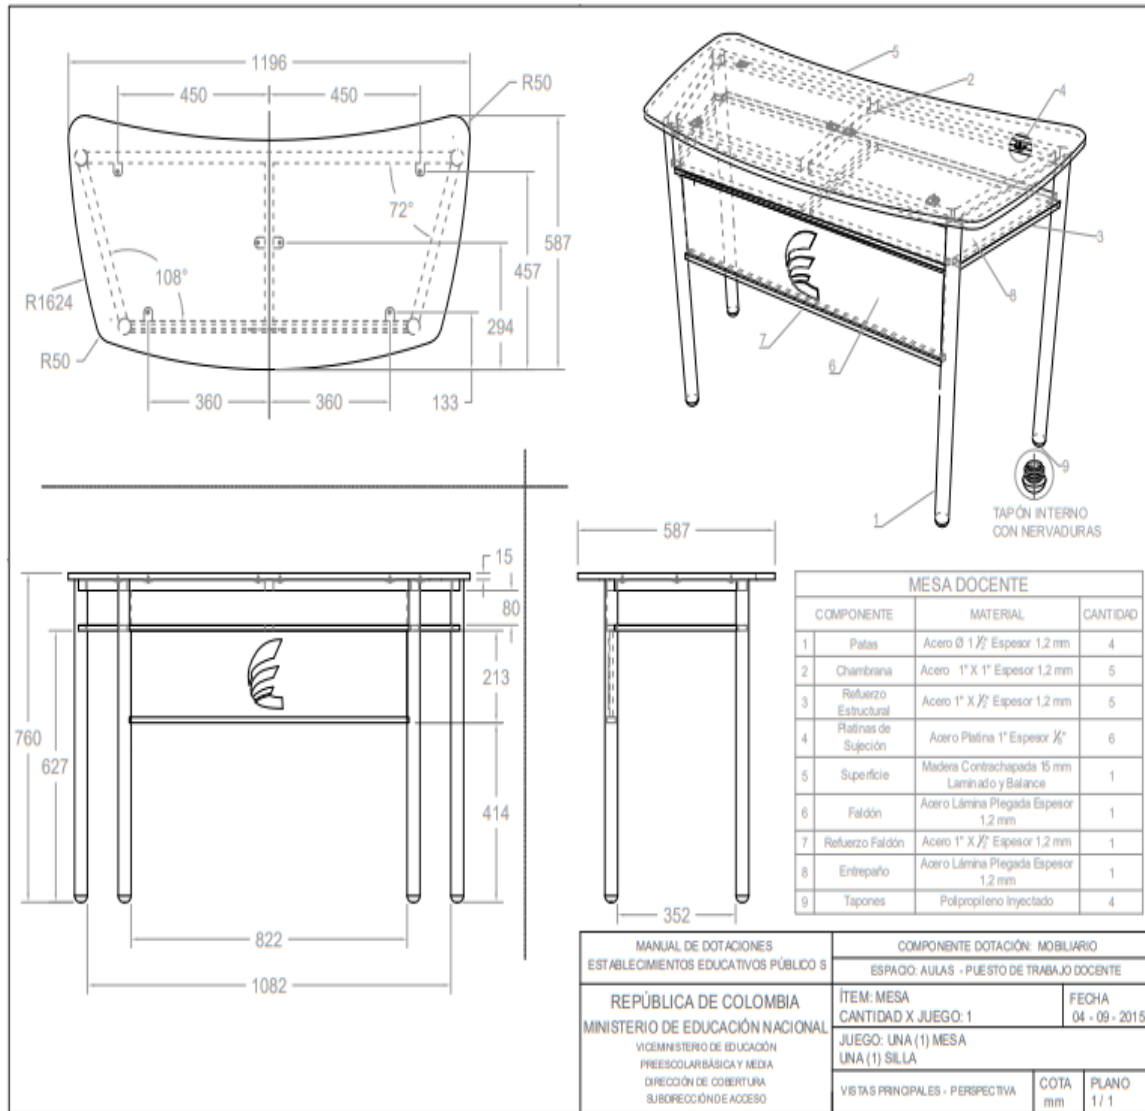


17.1. Silla puesto de trabajo docente

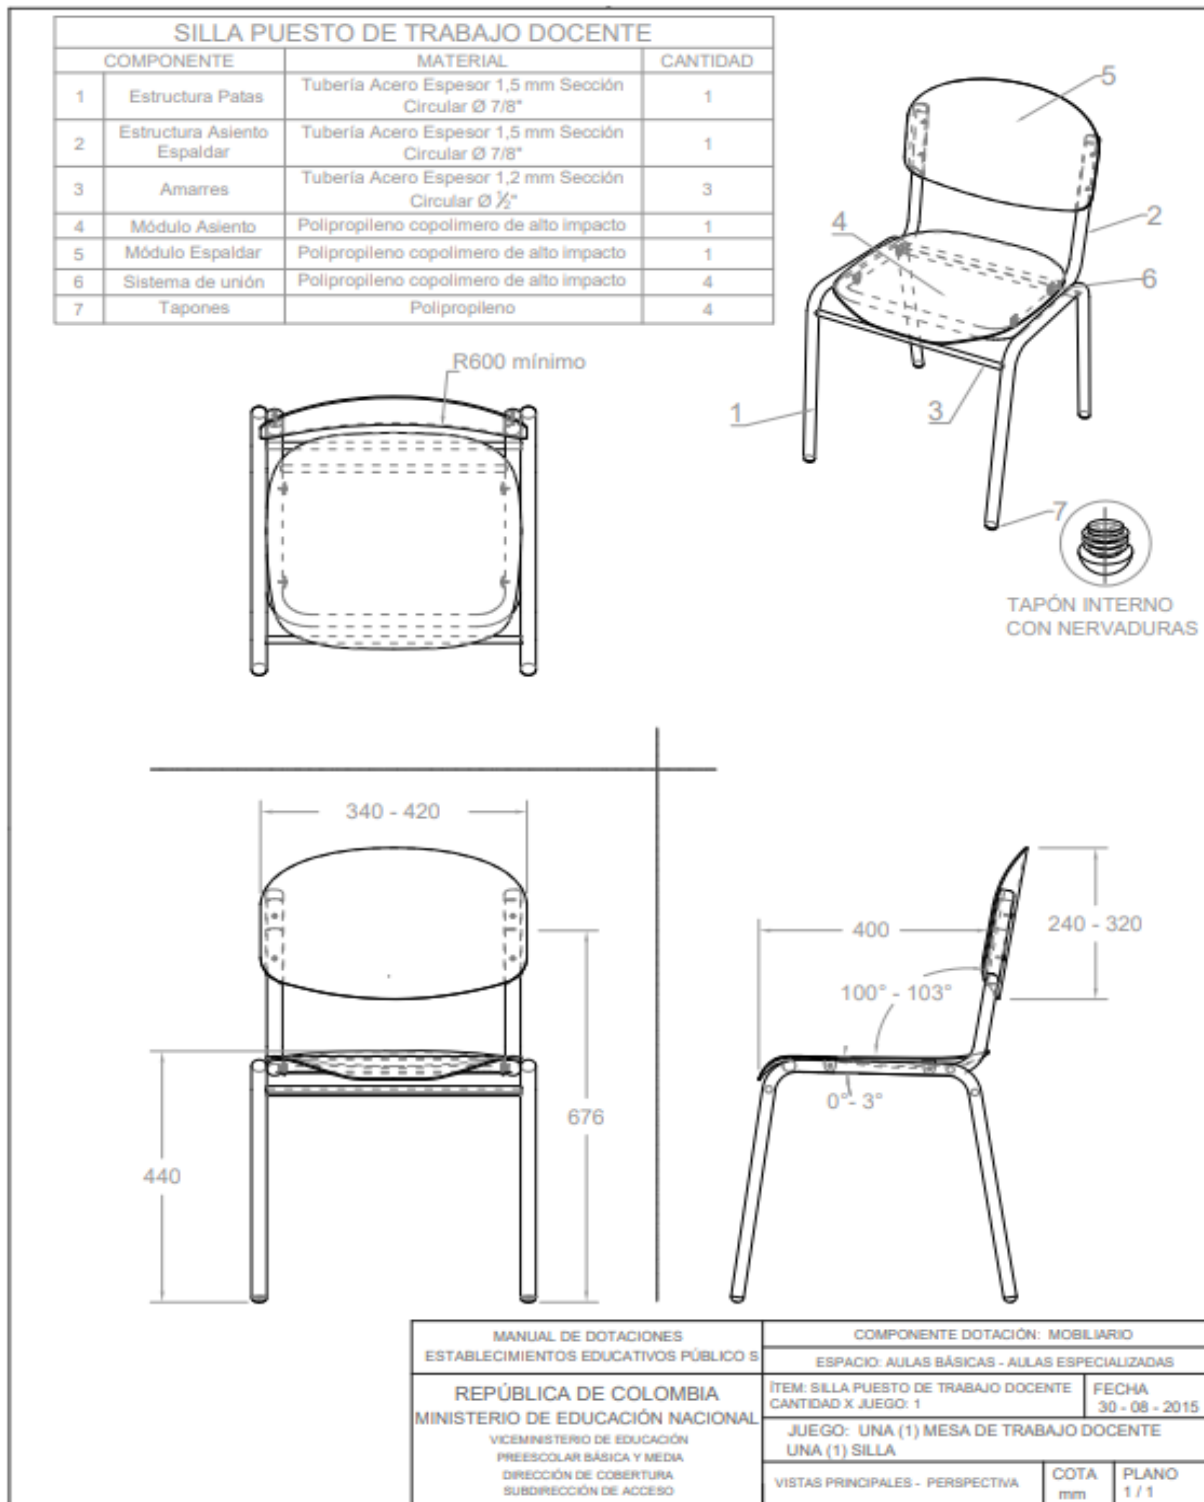


17.1. Mesa pupitre unipersonal primaria

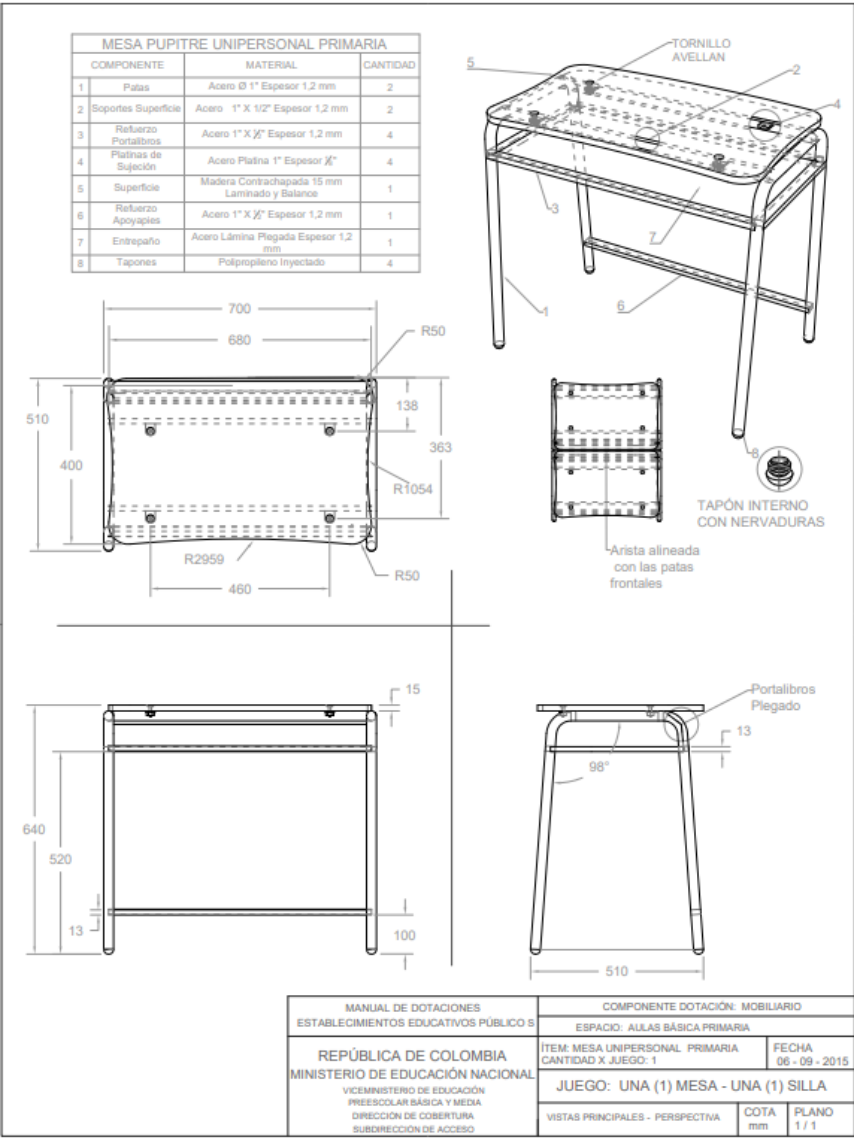

17.1. Silla puesto de trabajo primaria




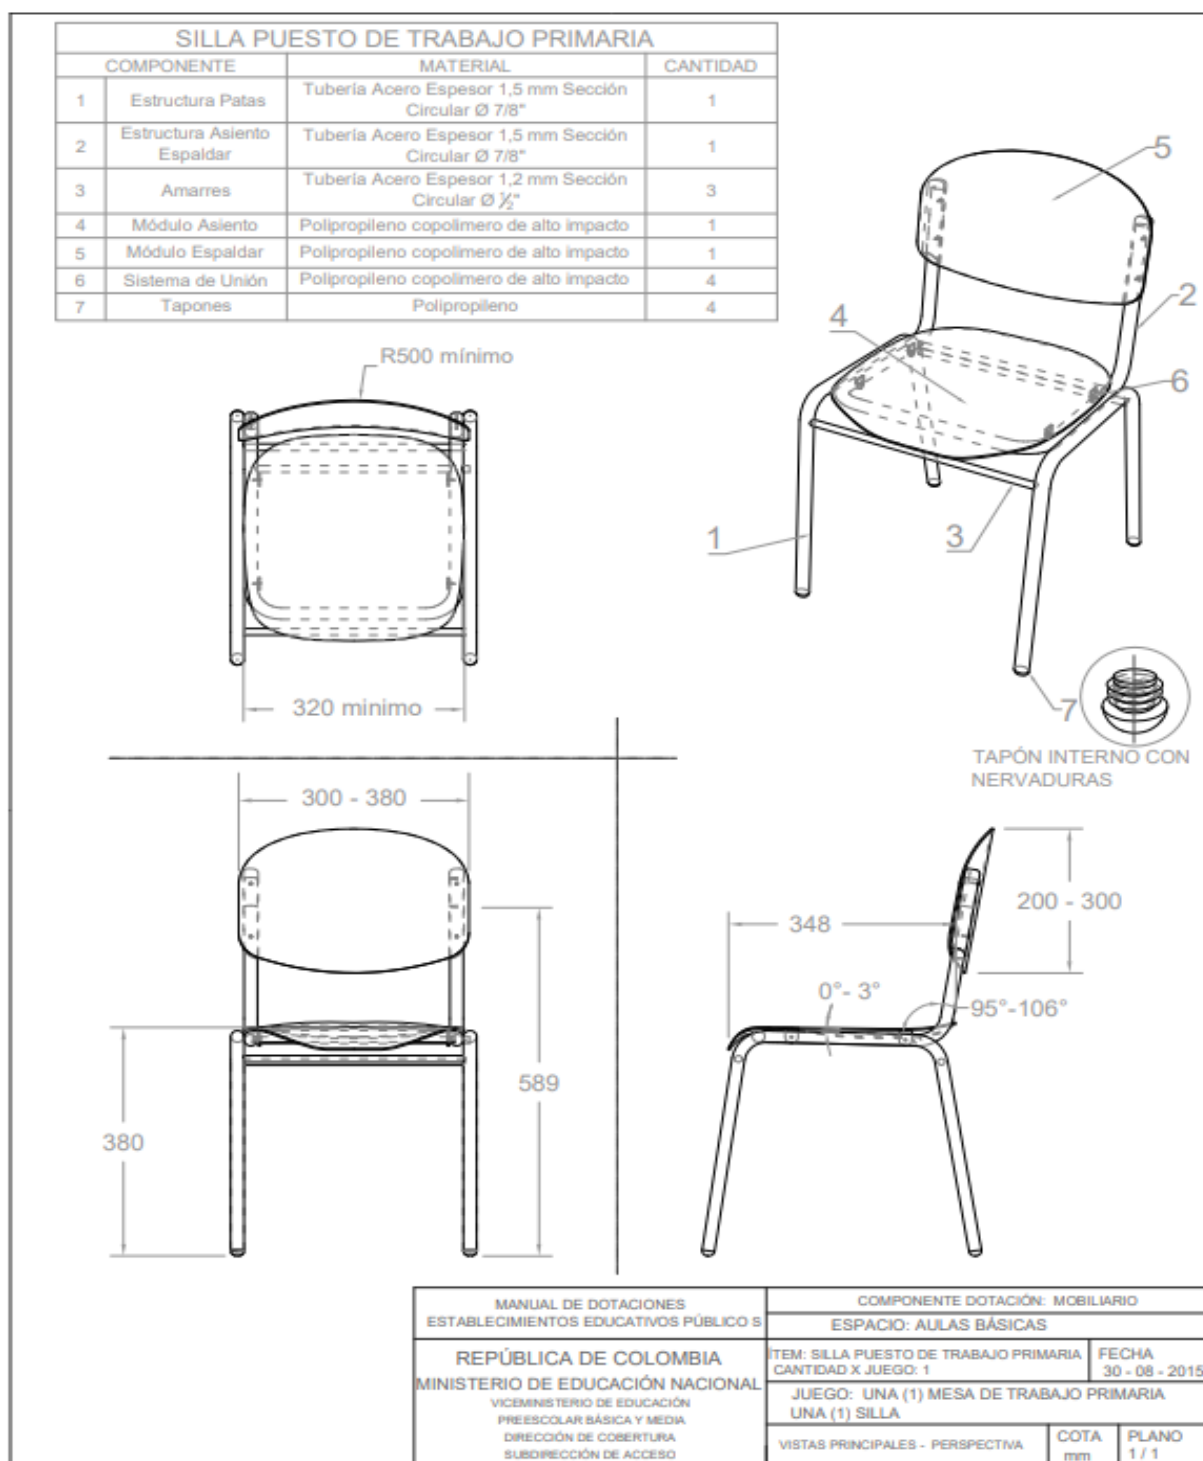


17.1. Mesa pupitre unipersonal secundaria

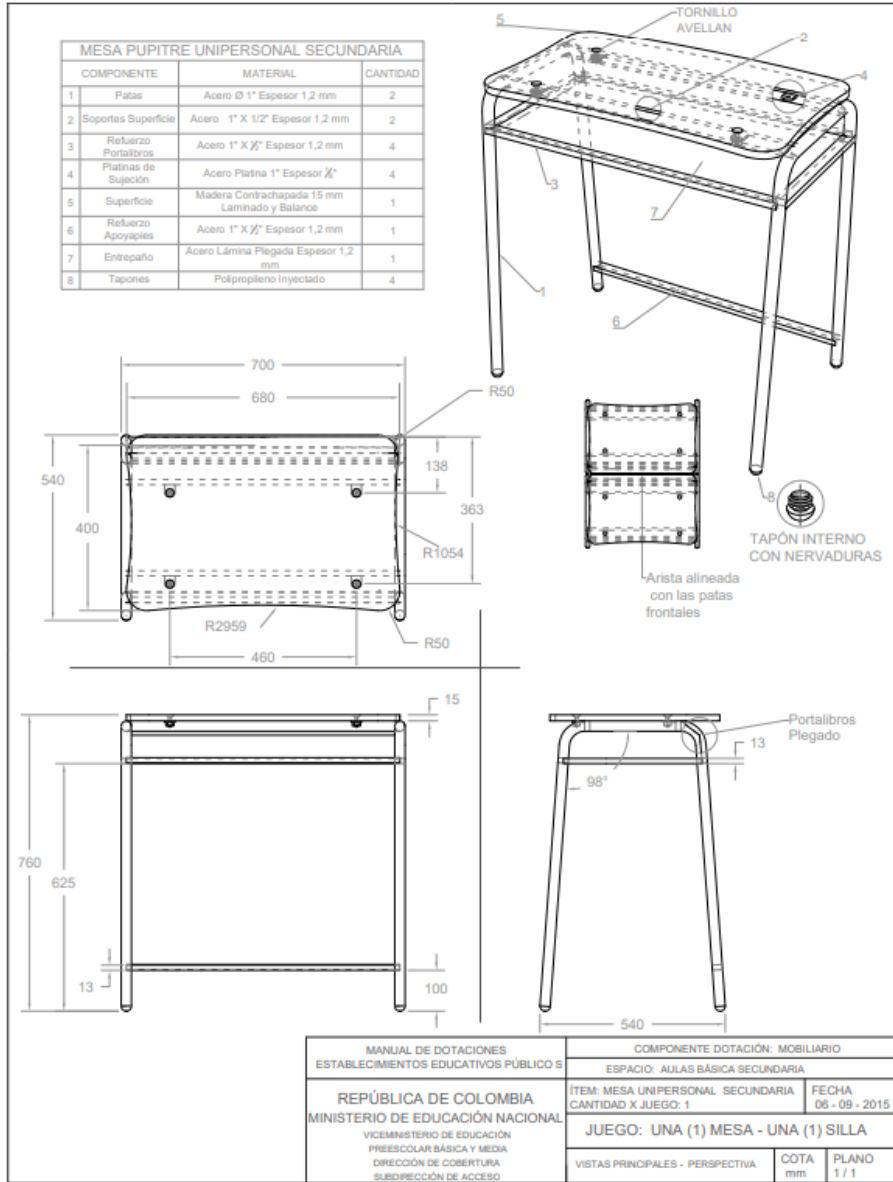


17.1. Silla puesto de trabajo secundaria

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
2	Estructura Asiento Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
3	Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø ½"	3
4	Módulo Asiento	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
5	Módulo Espaldar	Polipropileno copolímero de alto impacto	1
6	Sistema de Unión	Polipropileno copolímero de alto impacto	4
7	Tapones	Polipropileno	4

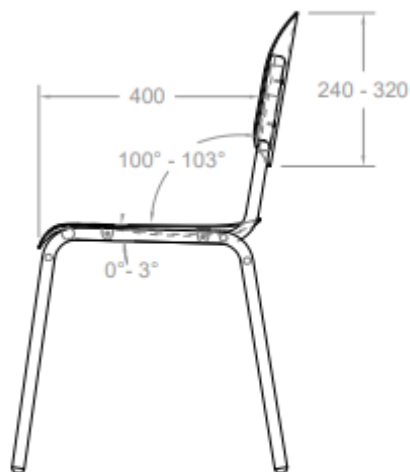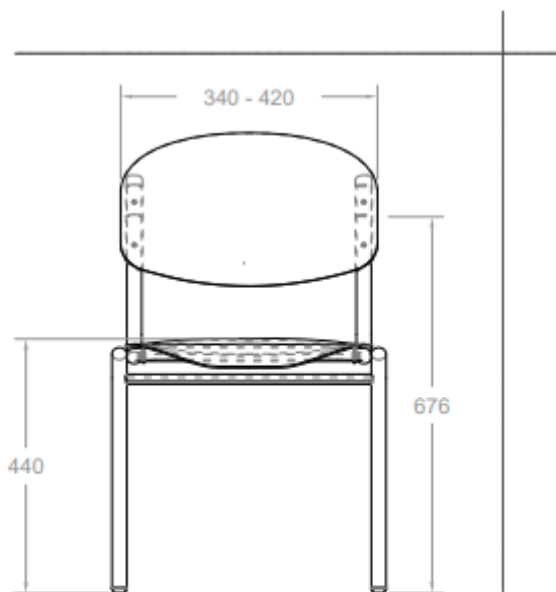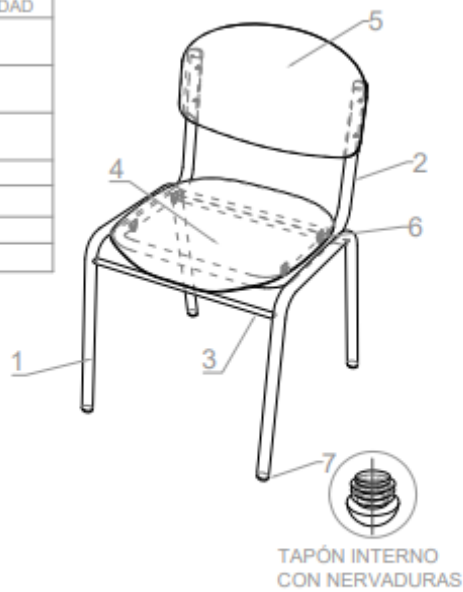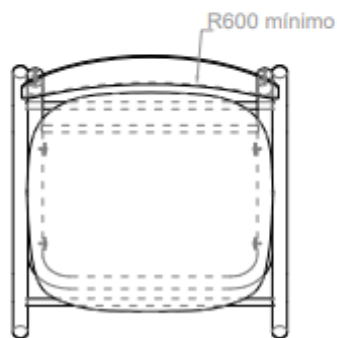


MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS BÁSICAS		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ITEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA CANTIDAD X JUEGO: 1	FECHA 30 - 08 - 2015	
	JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO SECUNDARIA UNA (1) SILLA		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA	COTA mm	PLANO 1 / 1


17.1. Tablero

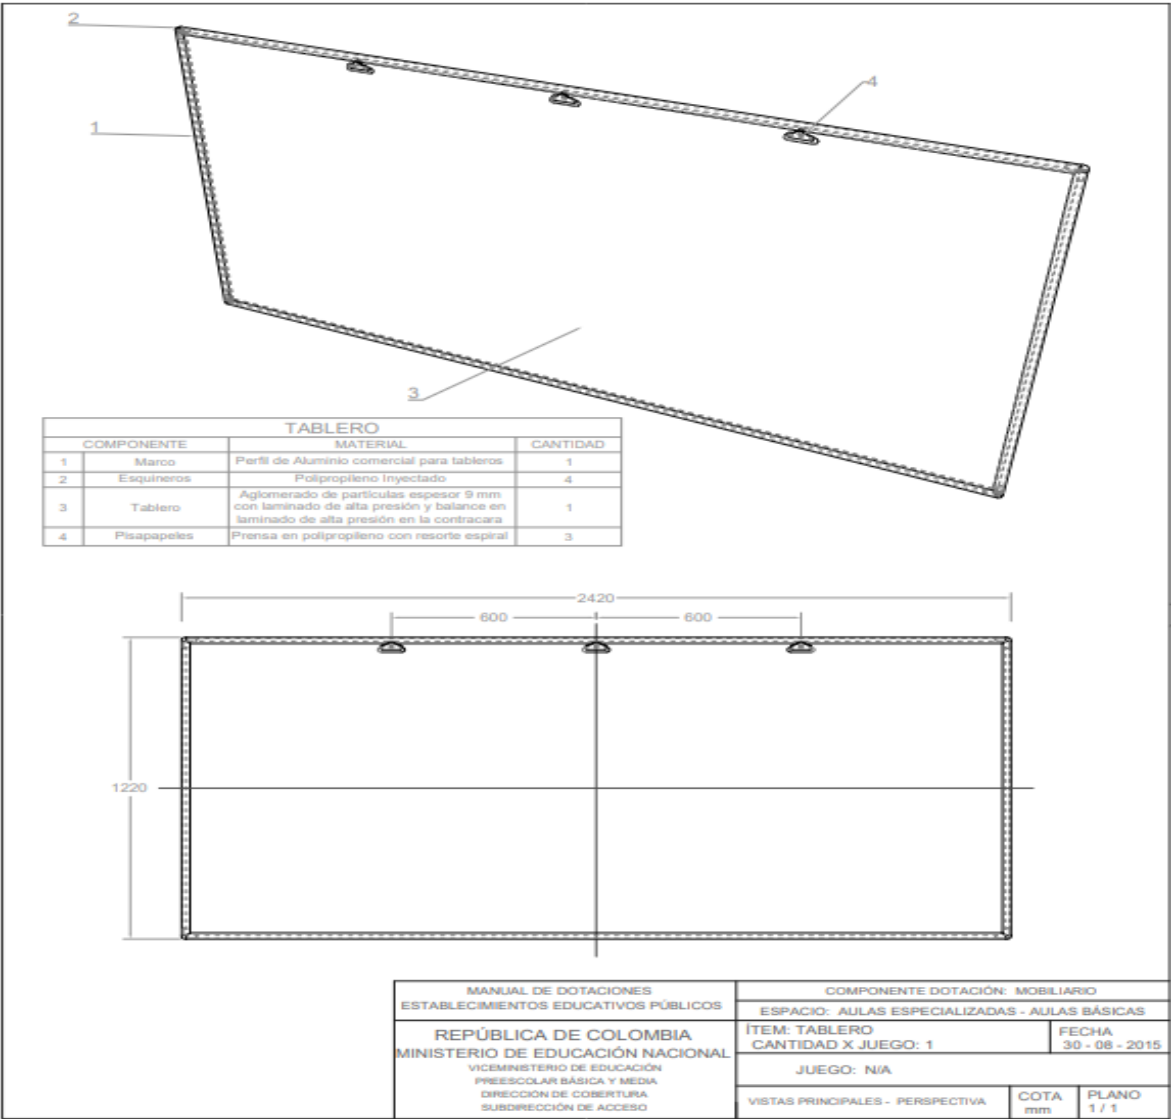


17.1. Mesa de trabajo preescolar

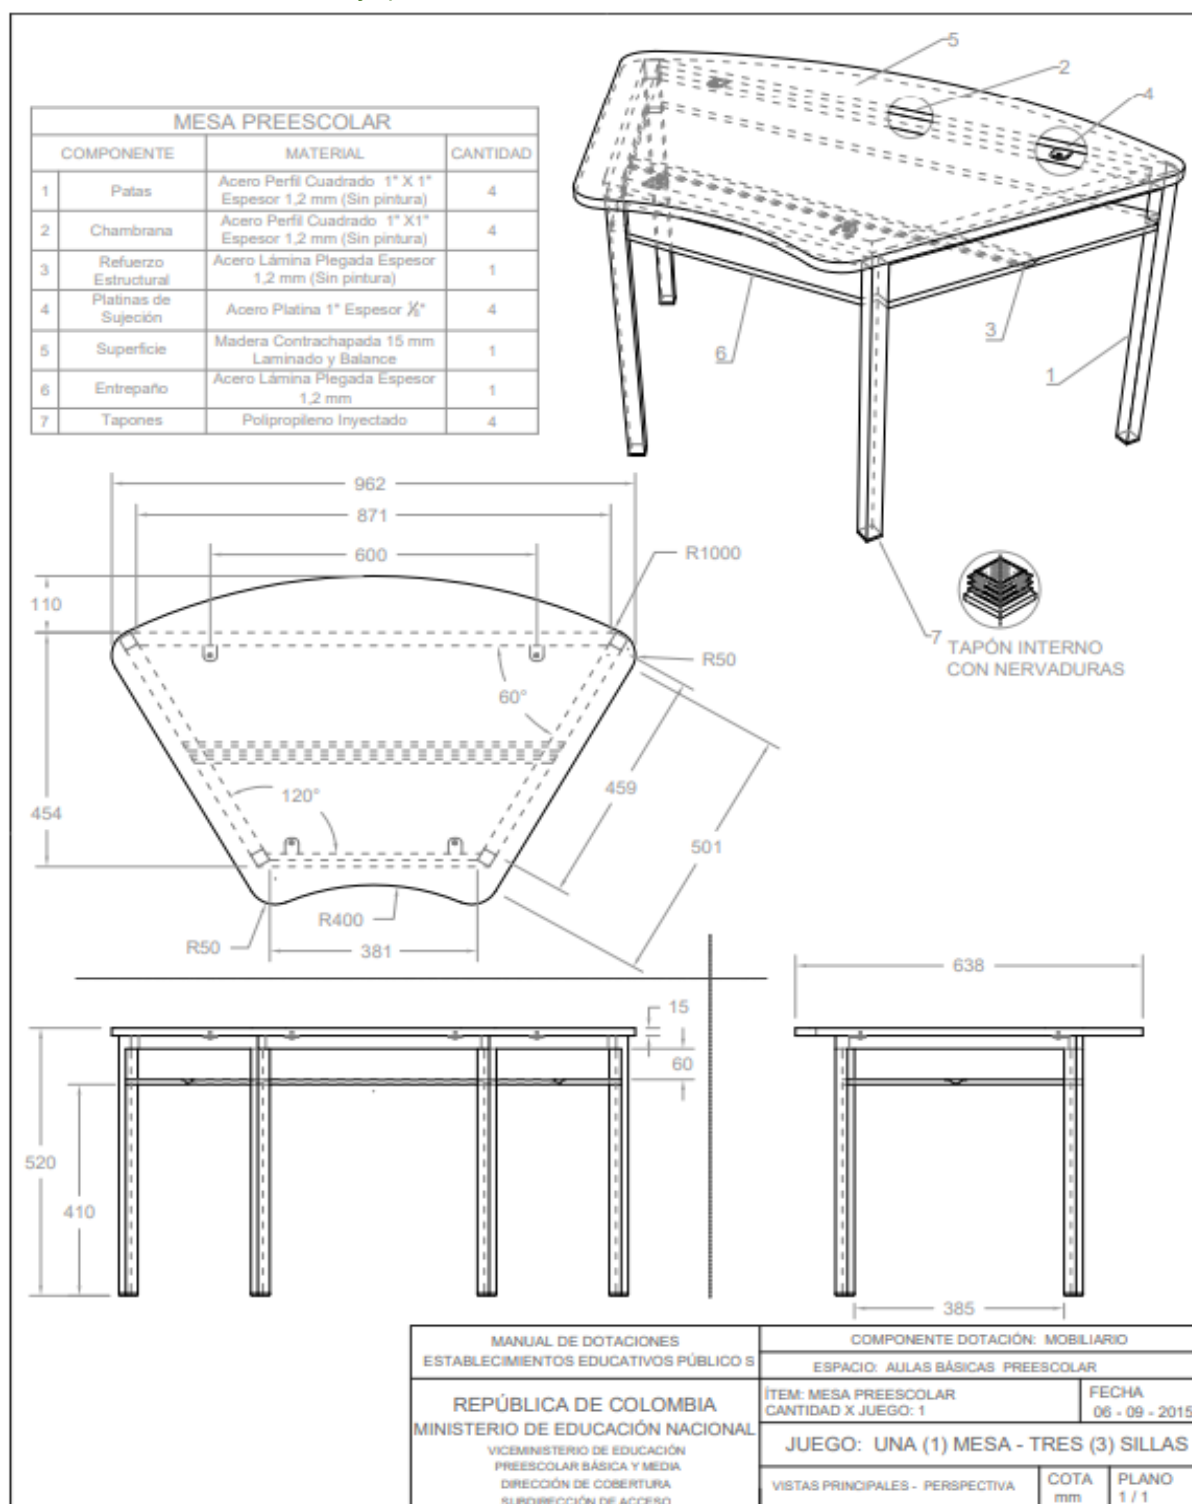

17.1. Silla puesto de trabajo preescolar

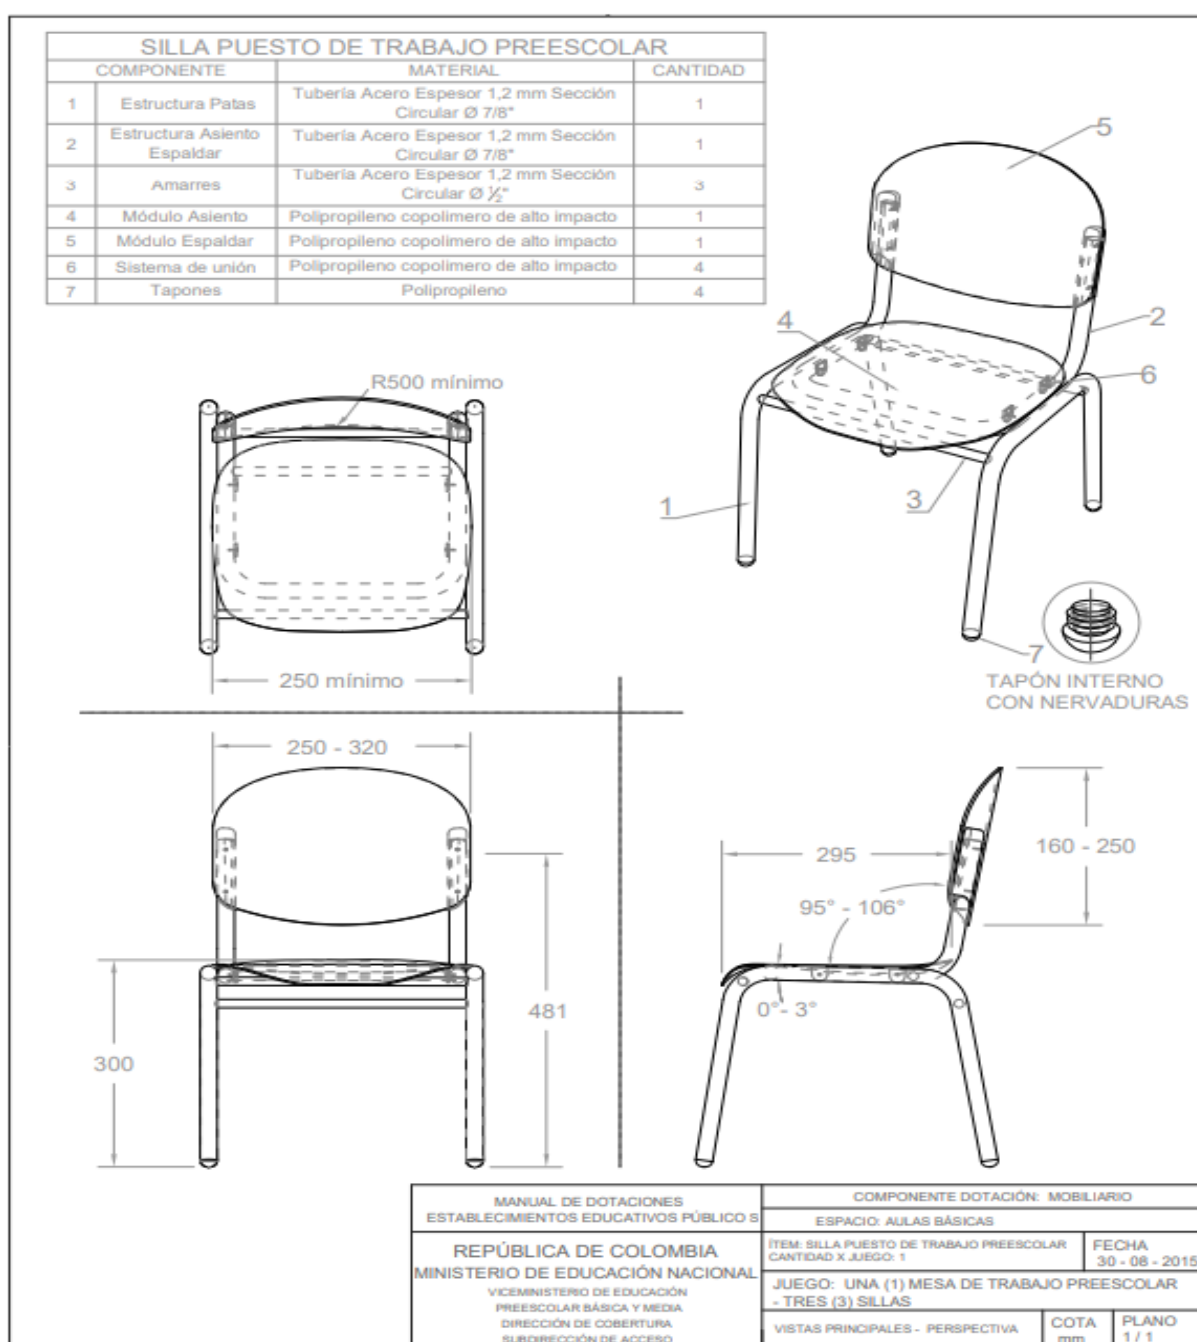

17.1. Casillero

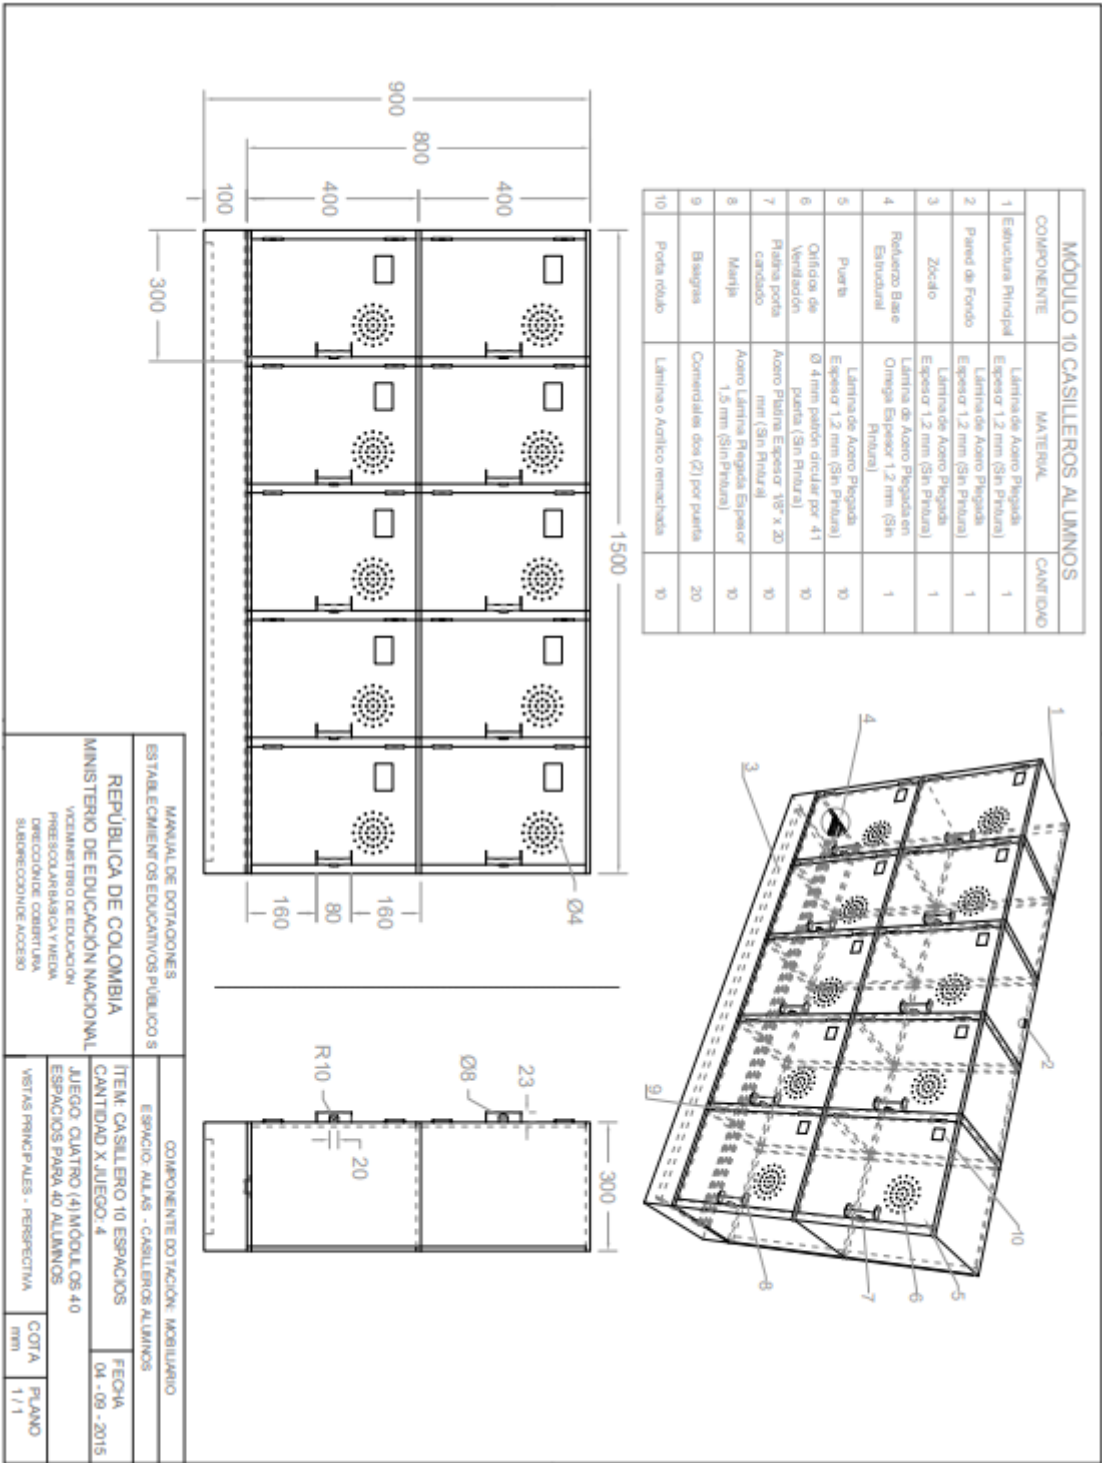

18. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL																						EJECUCION								LIQUIDACION																		
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12				
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	
1. FIDUCIA																																																			
1.1	Constitución de Fiducia	Contribuyente Fiducia																																																	
1.2	Deposito del valor del impuesto a Fiducia	Contribuyente																																																	
1.3	Envio Certificación depósitos ART, MEN y DIAN	Fiducia																																																	
1.4	Presentación Cronograma General ART y MEN	Contribuyente																																																	
1.5	Aprobación Cronograma General	MEN																																																	
2. GERENCIA DEL PROYECTO																																																			
2.1	Preparacion Proceso Contratación Gerencia del Proyecto	Contribuyente Fiducia																																																	
2.2	Apertura y Cierre Proceso Contratación Gerencia del Proyecto y verificación de requisitos	Fiducia																																																	
2.3	Selección Gerente proyecto	Contribuyente																																																	
2.4	Suscripción Contrato Gerencia del Proyecto	Fiducia Gerencia																																																	
2.5	Suscripción acta de inicio de Gerencia del Proyecto	Fiducia Gerencia																																																	
3. INTERVENTORIA DEL PROYECTO																																																			
3.1	Preparación Términos de referencia Interventoría	Gerencia Fiducia																																																	
3.2	Mesa de trabajo con el Ministerio para la aprobación de los Tdr de interventoría	MEN GERENCIA FIDUCIA																																																	
3.3	Designación supervisor del contrato MEN (Artículo 7 Decreto 2469)	MEN																																																	
3.4	Aprobación Términos de referencia Interventoría por parte del MEN	MEN																																																	
3.5	Apertura y Cierre Proceso Licitación Interventoría	Fiducia																																																	
3.6	Selección de Interventor	Gerencia																																																	
3.7	Suscripción Contrato Interventor	Fiducia Interventoria																																																	
3.8	Suscripción Acta de Inicio Interventor	Fiducia Interventoria																																																	
4. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR																																																			
4.1	Preparacion de proceso de Licitación Privada Abierta de Proveedor	Gerencia Fiducia																																																	
4.2	Apertura y Cierre Proceso Licitación Ejecutor del proyecto	Fiducia																																																	
4.3	Selección de Proveedor	Gerencia																																																	
4.4	Suscripción contrato Proveedor	Fiducia Proveedor																																																	
4.6	Acta de inicio Proveedor	Fiducia																																																	
5. EJECUCION (Entrega de Dotación)																																																			
6.1	Concertación con el proveedor el cronograma de actividades, producción, despacho y entregas	Gerencia Proveedor Interventoria																																																	
6.2	Aprobación de especificaciones técnicas de dotación	Gerencia Interventoria																																																	
6.3	Proceso de compra de Dotacion	Proveedor																																																	
6.4	Verificación de especificaciones técnicas y calidad en instalaciones del proveedor	Interventoria																																																	
6.5	Entrega de dotación a Sedes Educativas	Proveedor																																																	
6.6	Verificacion de entregas en Sitio	Interventoria																																																	
6.11	Comité de Seguimiento Mensual	Gerencia Interventoria Supervision MEN																																																	
6.12	Comité de Seguimiento Quincenal	Gerencia Interventoria Proveedor																																																	
6.13	Elaboración de informe mensual por parte del Proveedor	Proveedor																																																	
6.14	Elaboración de informe mensual por parte de la interventoria	Interventoria																																																	
6.15	Reporte Aplicativo SPI	Gerencia																																																	

[illegible]

DETALLE DE CONTRATACION DERIVADA	
CONTRATO	TIEMPO (Meses)
Fiducia del proyecto	12,00
Gerencia del Proyecto	9,00
Ejecutor	4,25
Interventoría	4,50


BERTONIS RENTERIA VALENCIA.
Secretario de Planeación y OO.PP.
San José del Palmar – Chocó.

